

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 3일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
깔림·뒤집힘

'26년 2월 27일(금) 20:58경 경북 울진시 소재
공사현장에서 조명 작업 중 **고소작업차가 전도**
되면서 작업대에 있던 재해자가 떨어져 사망



예방
대책

- 아웃트리거를 이용하여 지면에 수평을 이루게 설치하고 허용 경사도가 초과되는 곳에서는 작업을 금지합니다.
- 제조사 및 제어 시스템에서 정한 허용반경을 초과하지 않도록 붐의 길이, 각도 등을 제한하며 조작합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 4일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 2월 28일(토) 10:00경 서울 강남구 소재
공사현장 2층에서 사다리를 이용한 보의 면정리
작업 중 건물과 외부비계 사이로 떨어져 사망



예방
대책

- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간이 설치된 이동식비계, 고소작업대 등 올바른 작업발판을 사용합니다.
- 건물과 외부비계 사이의 개구부에 추락방호망을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 6일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 3월 5일(목) 08:52경 전남 해남 소재
축사 지붕 위에서 이동 중 채광창을 밟고
아래로 떨어져 사망



예방
대책

- 지붕 위에서 작업할 때에 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하여야 합니다.
- 추락 위험 장소에서 작업할 때에는 안전대 부착설비를 설치하고 작업자는 안전대 착용 및 안전고리를 체결하여야 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 9일 11:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
맞음

'26년 3월 6일(금) 08:33경 대전 유성구 소재 철거공사 현장에서 굴착기에 연결된 **압쇄기가 탈락하며 아래에 있던 재해자가 맞아 사망**



예방
대책

- 굴착기 버킷 체결 시 탈락방지용 안전핀을 체결합니다.
- 굴착기 사용 작업 시 굴착기 작업반경 내 작업자의 출입금지, 장비 유도자 배치 등 접촉방지조치를 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 10일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
부딪힘

'26년 3월 9일(월) 10:14경 경북 영천시 소재 하수도 정비 공사 현장에서 자재 운반을 위해 후진 중인 트럭에 부딪히며 깔려 사망



예방
대책

- 차량계 하역운반기계와 부딪칠 위험이 있는 장소에는 유도자를 배치하고 신호방법을 정하여 신호에 따라 운전합니다.
- 차량계 하역운반기계의 운행경로, 작업방법, 사고 예방대책 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 11일 11:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
깔림·뒤집힘

'26년 3월 10일(화) 10:13경 전북 정읍시 소재 건물 내부 철거공사 현장에서 **벽체철거 작업 중 해체 중인 벽체에 깔려 사망**



예방
대책

- 해체작업계획을 사전에 수립하고 위험성평가를 실시하여 작업방법, 안전조치를 근로자에게 공유·전파하여야 합니다.
- 실내 벽체 해체작업을 하는 경우 해체작업계획서에 따라 벽의 상부에서 하부 방향으로 분할하여 해체합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 11일 11:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
깔림·뒤집힘

'26년 3월 6일(금) 13:59경 서울 마포구 소재
인테리어 공사현장에서 **벽체철거 작업 중**
해체 중인 벽체에 깔려 사망



예방
대책

- 실내 벽체 해체작업을 하는 경우 해체작업계획서에 따라 벽의 상부에서 하부 방향으로 분할하여 해체합니다.
- 벽 상부를 분할 해체할 때에는 작업조건에 맞는 작업발판 설치와 안전모·안전대를 지급하고 착용하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 13일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 3월 1일(일) 06:50경 서울 마포구 소재 철거현장에서 개구부에 덮힌 판넬 위를 걷고 지나던 중 **판넬이 부서지며 떨어져 사망**



예방
대책

- 추락 위험이 있는 개구부에는 안전난간 또는 충분한 강도를 가진 덮개를 견고하게 설치합니다.
- 개구부임을 인지할 수 있도록 개구부 표시를 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 16일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
부딪힘

'26년 3월 14일(토) 10:59경 경북 포항시 소재 도로확장 공사 현장에서 **후진 중인 굴착기에 부딪히며 깔려 사망**



예방
대책

- 굴착기 작업 시 이동경로와 작업반경 내 접근하지 못하도록 작업지휘자 또는 유도자를 배치합니다.
- 운전자는 작업지휘자 또는 유도자와 신호방법을 정하고 정해진 신호에 따라 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 17일 11:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 3월 14일(토) 15:50경 경기 안산시 소재
공사현장에서 **시스템동바리에 설치된 작업발판**
위로 이동 중 단부로 떨어져 사망



예방
대책

- 시스템 동바리 등 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 작업발판과 안전난간을 설치하여야 합니다.
- 안전난간을 설치하기 곤란한 경우 추락방호망 설치 또는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지급하여 체결하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 17일 11:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
맞음

'26년 3월 13일(금) 15:46경 서울 강남구 소재
공사현장에서 **휴막이시설 철골 조립 작업 중**
이동식 크레인으로 인양 중인 철판에 맞아 사망



예방
대책

- 인양 작업 전에 인양물이 빠지지 않도록 줄걸이 및 체결방법 등 중량물 취급 작업계획을 수립하여야 합니다.
- 인양물 아래 장소에는 자재가 낙하하여 맞을 위험이 있으므로 출입통제를 실시하여야 합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2026년 3월 19일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 3월 17일(화) 08:55경 충북 단양군 소재 리모델링 공사 현장에서 천장 조명 설치 작업 중 천장 마감재(텍스)를 밟고 떨어져 사망

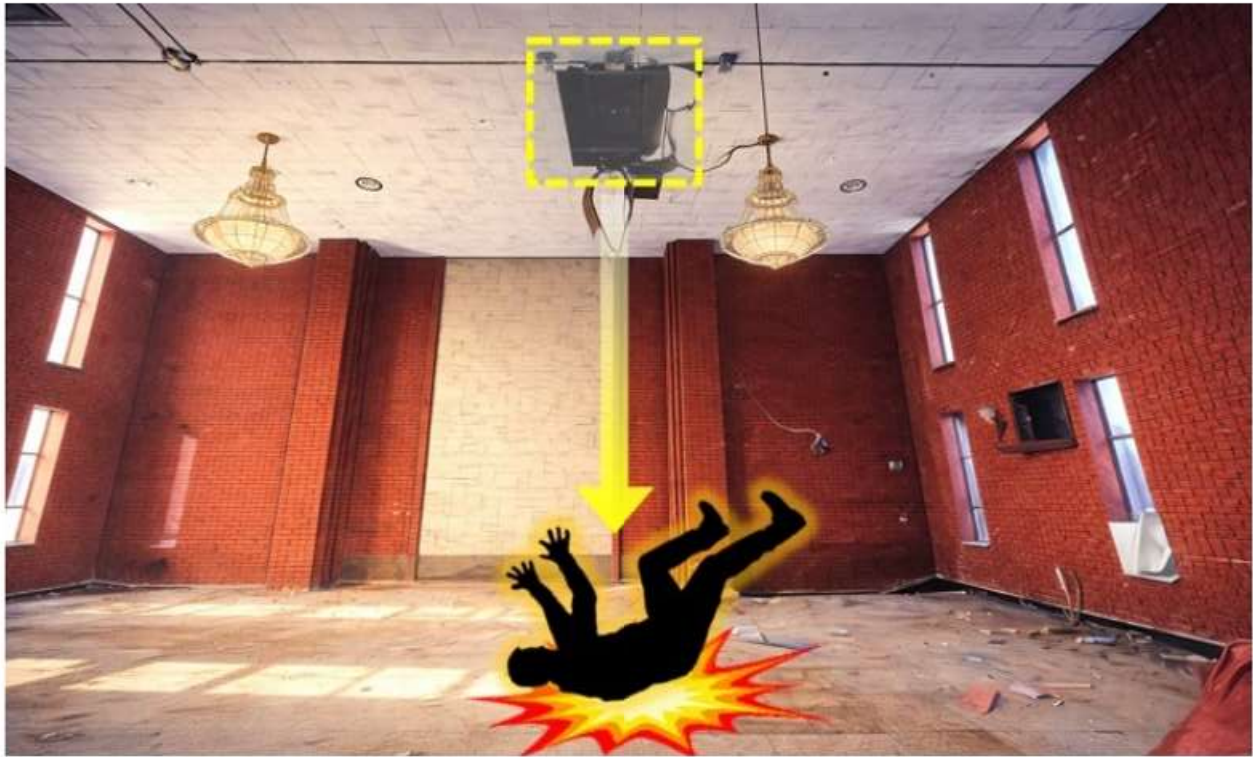

예방
대책

- 천장 상부에서 작업하는 경우 바닥으로부터 견고한 구조의 비계 등의 작업발판을 설치 후 작업합니다.
- 작업발판 설치가 곤란한 경우 추락방호망 설치 또는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지급하여 체결하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 26일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
무너짐

'26년 3월 25일(수) 11:21경 경기 안성시 소재 토목공사 현장에서 배수관 매설 작업 중 굴착 측면의 토사 붕괴로 매몰되어 사망



예방
대책

- 토목공사 현장에서 굴착 측면이 갑자기 붕괴하지 않도록 굴착면의 기울기를 준수하여 작업합니다.
- 굴착면 기울기가 가팔라서 토사 붕괴 위험이 있는 경우 지보공을 설치하는 등의 필요한 조치를 실시하여야 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 27일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 3월 23일(월) 13:44경 충북 청주시 소재
건설현장 내 2층 철골 보에서 고소작업대로
이동 중 지상으로 떨어져 치료 중 사망



예방
대책

- 철골 보, 기둥 등 추락 위험이 있는 장소에는 안전대부착설비를 설치하고 안전대를 지급하여 착용하도록 합니다.
- 작업대의 붐대를 상승시킨 상태에서는 고소작업대를 벗어나지 말아야 하며 불가피한 경우 안전대부착설비 설치 및 안전대를 체결한 상태에서 이동하여야 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 30일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 3월 27일(금) 03:28경 전남 장성군 소재 역사 증축공사 현장에서 승강장 지붕 철거 작업 중 채광창을 밟고 떨어져 사망



예방
대책

- 채광창 등 강도가 약한 재료의 지붕 위에서는 견고한 구조의 덮개 또는 발판을 설치하여야 합니다.
- 작업발판 설치가 곤란한 경우 추락방호망 설치 또는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지급하여 체결하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 30일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 3월 25일(수) 09:21경 충남 천안시 소재 태양광 설치 공사현장에서 태양광 철골 구조물 점검 중 채광창을 밟고 떨어져 사망



예방
대책

- 지붕에서 작업하는 경우 위험성평가를 통해 채광창의 위치와 위험성, 안전조치를 종사자에게 사전에 공유하여야 합니다.
- 채광창 등 추락 위험이 있는 장소에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 작업 환경에 따라 추락방호망 설치 또는 안전대부착설비를 설치하고 안전대를 지급하여 체결하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 30일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 3월 28일(토) 09:55경 경기 화성시 소재
인테리어 공사 현장에서 **천창 판넬 위에서**
이동 중 판넬이 파손되어 떨어짐



예방
대책

- 판넬 등 강도가 약한 재료의 위에서 작업하는 경우 견고한 구조의 작업발판을 설치하여야 합니다.
- 판넬 상부를 이동하거나 작업하는 경우 추락방호망 또는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지급하고 체결하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 31일 11:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 3월 26일(목) 10:07경 대구 중구 소재 인테리어 공사 현장의 이동식 비계 위에서 천장 마감 작업 중 **바닥으로 떨어져 치료 중 사망**



예방
대책

- 이동식 비계의 최상부에는 안전난간을 설치하고 난간 설치가 어려운 경우 안전대 등의 보호구를 착용 및 체결합니다.
- 비계의 갑작스러운 이동 및 전도를 방지하기 위해 브레이크·뺨기 등으로 바퀴를 고정하고 아웃트리거를 설치합니다.

실내 해체 공사 사고 다발 경보

발령일시: 2026년 3월 16일 17:00

중대재해
사이렌



'26.3월, 실내 해체 공사현장 사망사고 지속 발생!

주요 사망사고 사례

- 3.1.(일) 서울 소재 실내 해체 현장에서 개구부를 덮은 자재를 밟아 자재가 파손되면서 추락하여 사망
- 3.6.(금) 서울 소재 인테리어 공사 현장에서 벽체 해체 중 벽체에 깔려 사망
- 3.10.(화) 정읍 소재 실내 해체 공사 현장에서 벽체 해체 중 벽체에 깔려 사망

특히, 해체 작업 중 벽체에 깔리는 사고 연이어 발생!

주요 안전 수칙

추락 방지



- 추락 위험 장소에는 안전난간, 추락방호망 등 추락예방시설 설치
- 덮개 설치 시 충분한 강도를 가진 구조로 설치
- 안전대 부착설비 설치 후 안전대 착용·체결

작업계획 준수



- 해체 건물 등의 구조, 상태 등을 사전에 파악
- 해체 작업계획 수립
- 해체 방법 및 순서 준수 (상부 → 하부 順 등)
- 시방서 등 설계도서 준수

안전성 확보



- 사전에 붕괴 위험 대비 안정성 평가 실시
- 버팀대·지지대 설치 등 전도 방지 조치 실시

출입 금지



- 추락, 붕괴 위험 장소 사전에 파악 후 안전교육
- 벽체 전도 위험 반경은 출입 금지 조치
